



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA

ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/13), članka 39. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar, na 153.sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar održanoj dana 11. svibnja 2021. godine, podnosi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2020. GODINU

1. UVOD

1.1. Ustrojstvo lučke uprave

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11, 56/16, 98/13), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07 i 6/11) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće koje čini 5 članova od kojih osnivač imenuje tri člana, jednog člana imenuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave te jednog člana predstavnici ovlaštenika koncesije koji obavljaju djelatnost na lučkom području.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove, a imenuje ga Upravno vijeće na prijedlog natječajne komisije, a uz suglasnost župana i ministra, na vrijeme od četiri godine.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) kojim se utvrđuje potreban broj stručno–tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.

1.2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

1. brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
3. stručni nadzor nad gradnjom održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe,
5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2020. GODINU

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Vrste lučkih djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet su:

- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala,
- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
- ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).

U lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja u kojima ne postoji gospodarski interes za pružanje usluga prihvata otpada, opskrbe vodom i električnom energijom, te usluge može pružati lučka uprava.

Prihodi ostvareni pružanjem usluga iz prethodnog stavka moraju se prikazati u bilanci lučke uprave, te biti odvojeni od naplate lučkih pristojbi.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14) i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15).

1.2. LUČKO PODRUČJE

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije („Narodne novine“ 29/13, 49/13 i 135/14) razvrstano je ukupno 114 luka otvorenih za javni promet, od čega su 3 luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, te 8 luka od županijskog značaja i 103 luke od lokalnog značaja.

Vlada Republike Hrvatske je 03. rujna 2015. godine („Narodne novine“ 95/15) donijela Odluku o davanju suglasnosti na odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja, KLASA:342-21/03-01/98, URBROJ:2198/1-02-15-46, a koja se odnosi na proširenje nadležnosti Županijske lučke uprave Zadar na nove luke i proširenje obuhvata lučkih područja postojećih luka, osim za lučko područje luke Silba/Mul.

LUKE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA		
<ul style="list-style-type: none"> • luka Preko – putnička luka • luka Brbinj Lučina – putnička luka • luka Zaglav – putnička luka • luka Silba Žalić – putnička luka 	<ul style="list-style-type: none"> • luka Biograd – putnička luka • luka Tkon – putnička luka • luka Pag – putnička luka • luka Fortica – putnička luka 	
LUKE LOKALNOG ZNAČAJA		
<ul style="list-style-type: none"> • luka Premuda/Loza • luka Premuda/Krijal • luka Olib • luka Ist/Široka • luka Ist/Kosirača • luka Zapuntel • luka Brgulje • luka Molat/Lučina • luka Zverinac • luka Sestrunj/Kablin • luka Rivanj 	<ul style="list-style-type: none"> • luka Ošljak • luka Ždrelac • luka Banj • luka Dobropoljana • luka Neviđane • luka Mrljane • luka Barotul • luka Pašman • luka Kraj • luka Maslenica • luka Vinjerac 	<ul style="list-style-type: none"> • luka Silba – uvala Sotorišće • luka Bibinje – uvala Jaz • luka Rovanjaska • luka Nin • luka Zaton – uvala Dražnik • luka Novigrad • luka Proboj • luka Pakoštane • luka Posedarje

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2020. GODINU

<ul style="list-style-type: none"> • luka Rava Mala/Lokvina • luka Rava Velika/Marinica • luka Iž Veli • luka Iž Mali/Knež • luka Iž Mali/Bržanj • luka Veli Rat • luka Verunić • luka Iž Mali/Komoševo • luka Soline • luka Božava • luka Dragove • luka Savar • luka Luka • luka Žman • luka Muline • luka Sali • luka Ugljan/Selo • luka Čeprijanda • luka Lukoran • luka Sutomišćica • luka Poljana • luka Preko • luka Kali • luka Kukljica • luka Privlaka • luka Vrgada • luka Starigrad - Paklenica • luka Silba/Mul • luka Mandre • luka Šimuni • luka Povljana 	<ul style="list-style-type: none"> • luka Ražanac • luka Dinjiška • luka Miškovci • luka Košljun • luka Vlašići • luka Smokvica. • luka Zadar/Foša • luka Zadar/Draženica • luka Zadar/Maestral • luka Zadar/Jazine • luka Zadar/Bregdetti • luka Zadar/Diklo • luka Petrčane • luka Sukošan. • luka Kali – uvala Batalaža • luka Kali – uvala Mala Lamjana • luka Pakoštane – uvala Dugovača • luka Doleška Draga • luka Vrgada – uvala Sv. Andrija • luka Sestrunj – uvala Hrvatin • luka Privlaka – uvala Loznica • luka Ljubačka vala • luka Ražanac – uvala Plamići • luka Brbinj – uvala Jaz • luka Telašćica – uvala Mir • luka Telašćica – uvala Čušćica 	<ul style="list-style-type: none"> • luka Seline • luka Tribanj – Krušćica – uvala Lubardić • luka Sv. Filip i Jakov • luka Sv. Petar • luka Turanj • luka Ugrinić • luka Vir luka • luka Vir – uvala Prezida • luka Vir – uvala Lučica • luka Vir – uvala Sapavac • luka Vir – uvala Biskupnjača • luka Vir – uvala Slatinica • luka Vrsi – uvala Školjić • luka Kožino – Primorje • luka Škarda – uvala Trate
---	--	--

2. PRIHODI

Prihodi koje ostvaruje Županijska lučka uprava koriste se za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i nadgradnje, odnosno infrastrukture i suprastrukture, kao i za troškove poslovanja.

Prihodi lučke uprave su:

- lučke pristojbe,
- lučke naknade,
- naknada od koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti u skladu sa Zakonom,
- sredstva iz proračuna,
- ostali prihod.

U 2020. godini Županijska lučka uprava Zadar na temelju zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, ostvarila je prihode zajedno sa donacijama iz proračuna u iznosu od 49.916.719,07 kuna.

	OPIS		PLANIRANO 2020.	OSTVARENO 2020.	INDEKS
	1		2	3	3/2
I.	PRIHODI (1+2+3)		49.955.464,73	49.916.719,07	99,90
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+1e)		12.590.780,00	12.645.958,29	100,40
	1.a.	LUČKE PRISTOJBE	7.626.800,00	7.736.651,44	101,40
		- Pristojbe za upotrebu obale (od brodara Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada)	2.460.000,00	2.448.195,11	99,50
		- Pristojbe za upotrebu obale (za povremeni putnički promet)	46.800,00	62.668,50	133,90
		- Pristojba za upotrebu obale u teretnom prometu	30.000,00	37.431,80	124,80
		- Pristojbe za brodsku ležarinu	300.000,00	327.279,00	109,10
		- Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama	1.800.000,00	1.792.556,93	99,60
		- Pristojbe za vez u zimovanju	1.150.000,00	1.167.641,54	101,50
		- Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka	1.840.000,00	1.900.878,56	103,30
	1.b.	LUČKE NAKNADE	4.467.980,00	4.477.184,68	100,20
		-usluge priveza i odveza brodova	3.814.240,00	3.814.242,58	100,00
		- usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom	531.740,00	536.428,10	100,90
		- usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu	110.000,00	107.394,00	97,60
		- naknada za pokidan sustav za vez i odlaganje ribarske mreže na operativnoj obali	12.000,00	19.120,00	159,30
	1.c.	NAKNADE OD KONCESIJA	445.000,00	374.625,35	84,20
	1.d	PRIHODI OD IMOVINE	44.800,00	50.502,24	112,70

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2020. GODINU

		-Prihodi od kamata na depozite, teč.razlika i najma prostora	44.800,00	50.502,24	112,70
	1.e.	OSTALI PRIHODI	6.200,00	6.994,58	112,80
		-Naplaćena dospjela otpisana potraživanja i ostali nespomenuti. prihodi	6.200,00	6.994,58	112,80
2.		SREDSTVA IZ PRORAČUNA I KOH.FONDA EU	29.288.604,73	29.257.212,27	99,90
	2.a	SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (MMPI i MRR i fondova EU)	10.061.395,73	10.342.421,93	102,79
29221/1		Sufinanciranje radova sanacije luke Silba Žalić	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
29221/1		Sufinanciranje radova uređenje obalnog pojasa luke Drage-Dugovača	4.561.395,73	4.561.395,73	100,0
29221/1		Sufinanciranje radova sanacije luke Vinjerac	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
16511		Sufinanciranje EU projekta FRAMESPORT		168.017,95	
16511		Sufinanciranje EU projekta MIMOSA		113.008,25	
	2.b	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA-ZADARSKE ŽUPANIJE	3.249.149,00	3.236.815,92	99,60
35121		Sufinanciranje održavanja objekata pomorske signalizacije	140.000,00	127.666,92	91,20
29221/2		Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja	1.685.500,00	1.685.500,00	100,00
29221/2		Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	1.423.649,00	1.423.649,00	100,00
	2.c	SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE PAKOŠTANE	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
29221/8		Sufinanciranje radova uređenje obalnog pojasa luke Drage Dugovača	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	2.d	SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA ZA EU PROJEKT	13.978.060,00	13.572.188,77	97,90
		Izgradnja trajektne luke Tkon faza I, podfaza II	13.978.060,00	13.677.974,42	97,90
3.		PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI	8.076.080,00	8.013.548,51	99,23

Županijska lučka uprava Zadar, u 2020. godini ostvarila je prihode od djelatnosti u iznosu od 12.645.958,29 kuna, od lučkih pristojbi za upotrebu obale u iznosu od 2.548.295,41 kuna, od pristojbi za brodsku ležarinu u iznosu od 327.279,00 kuna, od pristojbi za vez na komunalnom i nautičkom dijelu luka u iznosu od 3.693.435,49 kuna, od lučkih naknada za isporučene usluge u iznosu od 4.477.184,68 kuna, od naknada za koncesije u iznosu od 374.625,35 kuna, od financijske i nefinancijske imovine u iznosu od 50.502,24 kuna, te od ostalih prihoda u iznosu od 6.994,58 kuna.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2020. GODINU

Donacije iz Državnog proračuna RH na iznos od 10.342.421,93 kuna namjenska su sredstva za:

- sufinanciranje sanacije luke Silba Žalić u iznosu od 3.500.000,00 kuna,
- sufinanciranje radova na uređenju obalnog pojasa luke Drage Dugovača u iznosu od 4.561.395,73 kuna,
- sufinanciranje sanacije luke Vinjerac u iznosu od 2.000.000,00 kuna,
- sufinanciranje EU projekata FRAMESPORT i MIMOSA u iznosu od 281.026,20 kuna.


Donacije iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove u iznosu od 3.236.815,92 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje održavanja objekata pomorske signalizacije u iznosu od 127.666,92 kuna, za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture u iznosu od 1.423.649,00 kuna, te za sufinanciranje sanacije luka lokalnog značaja u iznosu od 1.685.500,00 kuna.

Donacije iz proračuna Općine Pakoštane u iznosu od 2.000.000,00 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje uređenja obalnog pojasa luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Drage Dugovača.

Donacije iz kohezijskog fonda EU u iznosu od 13.677.974,42 kuna, namjenska su sredstva za provedbu projekta izgradnje trajektne luke Tkon.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji ostvareni u iznosu od 8.013.548,51 kuna, prihodi su od donacija iz proteklih godina povezani sa nefinancijskom imovinom koja se amortizira i prizna u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine.

Struktura prihoda za 2020.god.

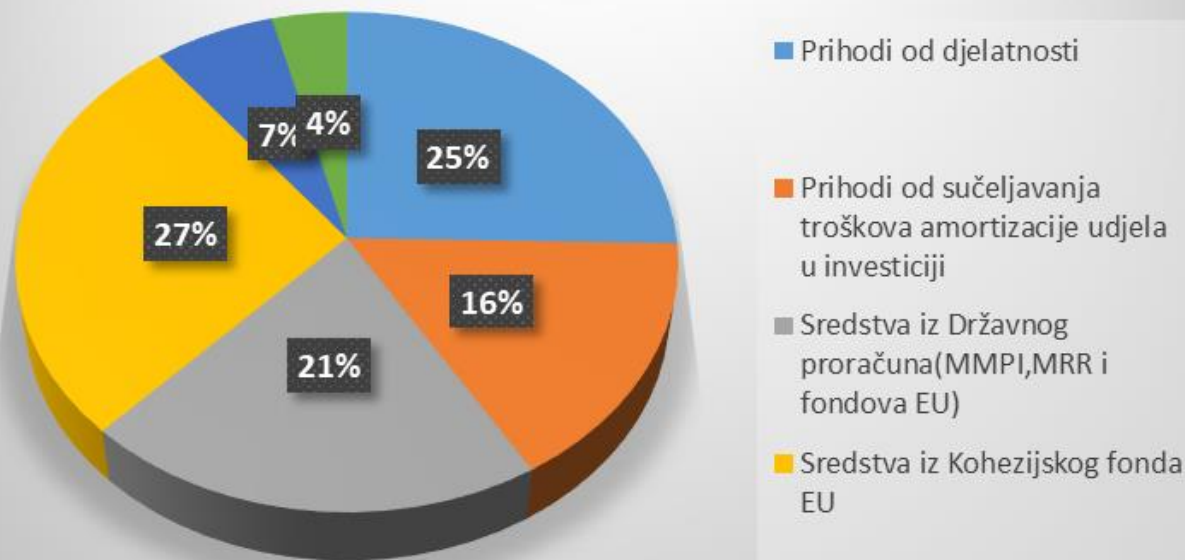

POTPISANI UGOVORI KORISNIKA PO LUKAMA

Cijena/Luka/Naziv	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sveukupno
ŽMAN								17	58	4	5	1		85
ŽDRELAC- RAVNICE											10	25	1	36
ZAGLAV								4	16	2	1	1		24
VRSI											38	7		45
VIR- SLATINA								2	1	4	38	12	6	63
VIR- SAPAVAC												54	3	57
VIR- LUKA												36	1	37
VIR- LUČICA												9		9
VIR- BISKUPNJAČA												56	1	57
VINJERAC											65	51	13	129
VERUNIĆ									4	5	2	4		15
VELI RAT									27	2	3	3		35
UGLJAN-SELO									37	2	13	7	3	62
UGLJAN-ČEPRIJANDA									40	12	1	5		58
UGLJAN-BATALAŽA									8	11	3	1		23
TURANJ											2	18	1	21
TKON													44	44
SV. FILIP I JAKOV											1	68		69
SUTOMIŠĆICA									43	15	12	8		78
SUKOŠAN					1		1	3	5	63	13	18	4	108
SOLINE								7	20	2				29
SILBA ŽALIĆ										34	8	1	1	44
SESTRUNJ										51	6	2		59
SELINE											33	63	5	101
SAVAR								2	5	2	1			10
SALI								73	8	4	3	5	4	97
RTINA											39	22		61
ROVANJSKA											39	22		61
RAŽANAC											62	27		89
PRIVLAKA- SELO										90	34	18		142
PRIVLAKA- LOZNICA										2	40	6	2	50
PREMUDA KRIJAL										55	15	4		74
PREKO-MAGAZIN- LB2									31	6	3	6	1	47
PREKO-LUČKI BAZEN 1									36	9	33	5		83
PREKO-KAŠUN-LB2									14	1	3	1		19
POLJANA									54	4	20	3	2	83
PETRČANE												133	4	137
PAŠMAN										25	7	10		42
PAKOŠTANE				30	2	1	4	6	36	10	2			91
PAG											215	168	10	393
OŠLJAK									34	9				43
OLIB										82	13	3		98
NOVIGRAD										2	125	14	12	153
NEVIDANE										22	8	4		34
MULINE									48	19	2	2		71
MRLJANE										7	1		20	28
MASLENICA											2	33	7	42
MANDRE				47	1		1		31	11	21	13	7	132
MAESTRAL	1			5				3	2	4	9	7	1	32
LJUBAČ											6	113	6	125
LUKORAN									49	11	3	6		69
LUKA									37	1	4	1	1	44
KUKLIJA				50	2	2	1	4	20	64	20	33	5	201
KRAJ										49	14	5	1	69
KALI								82	35	9	6	24	1	157
JAZINE	2	4	6	16	6	3	3	35	55	143	187	146	34	640
FOŠA	1	1	2	1		1		5	4	5	32	12	2	66
DRAŽENICA			2	8		2		5	5	15	36	20	4	97
DRAGOVE									3			2		5
DOBROPOLIANA										32	20	14		66
DIKLO		2		2			1		2	2	31	51	3	94
BREGDETTI		3	37	9	1		2	34	49	34	28	155	87	439
BRBINJ									6	2	1	3		12
BOŽAVA									34	1	2	3		40
BAROTUL										13	11	3		27
BANJ- PUMPURELA										14	10	8	3	35
Sveukupno	4	10	47	168	13	9	13	282	857	966	1362	1555	300	5586

3. RASHODI

Detaljni prikaz ostvarenih rashoda poslovanja dan je u izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2020. godinu koji je sastavni dio izvršenja Programa rada.

Ostvareni rashodi iskazuju se nastavno u tri programa:

1. Rashodi poslovanja
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Zadar.</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 28 (dvadeset osam) radnih mjesta i sva radna mjesta su popunjena.</p>																																											
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:	<p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava planira financijska sredstva u Financijskom planu za 2020. godinu u iznosu od 19.833.845,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 20.345.798,58 kuna i to kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>R.B.</i></th><th><i>NAZIV PROGRAMA</i></th><th><i>PLANIRANO 2020.</i></th><th><i>OSTVARENO 2020.</i></th><th><i>INDEKS</i></th></tr> <tr> <th></th><th>1</th><th>3</th><th>2</th><th>3/2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td><i>Rashodi za radnike (41)</i></td><td>3.174.100,00</td><td>3.131.744,13</td><td>98,67</td></tr> <tr> <td>2.</td><td><i>Materijalni rashodi (42)</i></td><td>4.764.985,00</td><td>4.580.871,79</td><td>96,14</td></tr> <tr> <td>3.</td><td><i>Rashodi amortizacije (43)</i></td><td>11.613.500,00</td><td>12.243.832,66</td><td>105,43</td></tr> <tr> <td>4.</td><td><i>Financijski rashodi (44)</i></td><td>170.000,00</td><td>280.691,91</td><td>165,11</td></tr> <tr> <td>5.</td><td><i>Ostali rashodi (46)</i></td><td>111.260,00</td><td>108.658,09</td><td>97,66</td></tr> <tr> <td></td><td>UKUPNO PROGRAM</td><td>19.833.845,00</td><td>20.345.798,58</td><td>102,58</td></tr> </tbody> </table>				<i>R.B.</i>	<i>NAZIV PROGRAMA</i>	<i>PLANIRANO 2020.</i>	<i>OSTVARENO 2020.</i>	<i>INDEKS</i>		1	3	2	3/2	1.	<i>Rashodi za radnike (41)</i>	3.174.100,00	3.131.744,13	98,67	2.	<i>Materijalni rashodi (42)</i>	4.764.985,00	4.580.871,79	96,14	3.	<i>Rashodi amortizacije (43)</i>	11.613.500,00	12.243.832,66	105,43	4.	<i>Financijski rashodi (44)</i>	170.000,00	280.691,91	165,11	5.	<i>Ostali rashodi (46)</i>	111.260,00	108.658,09	97,66		UKUPNO PROGRAM	19.833.845,00	20.345.798,58	102,58
<i>R.B.</i>	<i>NAZIV PROGRAMA</i>	<i>PLANIRANO 2020.</i>	<i>OSTVARENO 2020.</i>	<i>INDEKS</i>																																								
	1	3	2	3/2																																								
1.	<i>Rashodi za radnike (41)</i>	3.174.100,00	3.131.744,13	98,67																																								
2.	<i>Materijalni rashodi (42)</i>	4.764.985,00	4.580.871,79	96,14																																								
3.	<i>Rashodi amortizacije (43)</i>	11.613.500,00	12.243.832,66	105,43																																								
4.	<i>Financijski rashodi (44)</i>	170.000,00	280.691,91	165,11																																								
5.	<i>Ostali rashodi (46)</i>	111.260,00	108.658,09	97,66																																								
	UKUPNO PROGRAM	19.833.845,00	20.345.798,58	102,58																																								

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA:</p>	<p>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</p> <p><i>Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.</i></p> <p><i>Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.</i></p> <p><i>Program sadrži aktivnost i to:</i> <i>Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuču, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.</i> <i>Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU ZADAR.</i></p> <p><i>Za provedbu programa financijskog plana planirana su financijska sredstva u iznosu od 5.459.625,00 kuna, ostvarena su u iznosu od 5.466.218,89 kuna.</i></p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</p> <p><i>Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.</i></p> <p><i>Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.</i></p> <p><i>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje • Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije <p><i>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2019.-2020.g.</i></p>

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2020. GODINU

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:**

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2020. godinu planirana su financijska sredstva za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje te za snimak stanja i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 40.868.798,00 kuna, ostvarena su u iznosu od 40.440.590,16 kuna.

RB	Naziv projekta/ aktivnosti	PLANIRAN O 2020.	OSTVAREN O 2020.	INDE KS
	1	2	3	3/2
1.	Postrojenje i oprema u pripremi -pontoni (0521)	558.900,00	563.521,12	100,80
2.	Prijevozna sredstva u pripremi (0531)	135.440,00	135.440,00	100,00
2.	Projekt – Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551)	38.594.783,00	38.255.454,54	99,10
3.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551)	1.579.675,00	1.486.174,50	94,10
	UKUPNO PROGRAM	40.868.798,00	40.440.590,16	99,00

Projekti izgradnje i sanacije lučke podgradnje ostvareni u iznosu od 38.255.454,54 kuna odnose se na:

- Sanaciju luke Silba Žalić 8.304.829,46 kn
- Sanaciju luke Mrljane 2.508.983,26 kn
- Uređenje obalnog pojasa luke Drage Dugovača 7.841.882,70 kn
- Sanaciju luke Vinjerac 3.600.598,75 kn
- Izgradnju trajektne luke Tkon-EU projekt 13.621.744,53 kn
- Sanaciju obale i lukobrana luke Pakoštane 773.745,82 kn
- Sanacija lukobrana i školjere u luci Božava 375.625,00 kn
- Sanacija rive u luci Petrčane 440.539,54 kn
- Sanacija luke Nin 342.694,38 kn
- Izgradnja AB utvrdica u luci Preko 320.729,85 kn
- Izgradnja lučkog svjetla u luci Ošljak 48.750,00 kn
- Završetak kamenoklesarkih radova u luci Jazine 75.331,25 kn



Projektna dokumentacija za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje ostvarena u iznosu od 1.486.174,50 kuna odnosi se na :

- Projektnu dokumentaciju za dogradnju luke Sali 990.299,50 kn,
- Projektnu dokumentaciju za luku Nin 168.750,00 kn,
- Projektnu dokumentaciju za uređenje obalnog pojasa luke Sukošan 83.750,00 kn
- Projektnu dokumentaciju za luku Tkon 103.125,00 kn
- Projektnu dok.za san.luke Petrčane,Tribanj Kruščica i Premuda 69.000,00 kn
- Geodetski elaborat za luku Starigrad i Rovanjaska 71.250,00 kn

<p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p>	<p><i>U financijskom planu planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 14.374.220,00 kuna koja se odnose na rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija, realizirana su u iznosu od 14.879.579,69 kuna.</i></p>
---	---

<p>NAZIV PROJEKTA:</p> <p>IZVOĐAČ:</p> <p>IZNOS ULAGANJA U 2020. GODINI:</p>	<p>Izvođenje radova na sanaciji luke Silba Žalić</p> <p>Sun Adria d.o.o, Rijeka</p> <p>8.304.829,46 kn</p>
<p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p>	<div data-bbox="383 571 1503 1249" data-label="Image"> </div> <p>Predmet projekta su pomorsko-građevinski radovi na sanaciji luke Silba Žalić, sukladno glavnom građevinskom projektu izrađenom od društva RIJEKAPROJEKT d.o.o. Rijeka, a koji obuhvaća radove sanacije postojećih utvrdica, kamenog nasipa, obalnog zida (podlokavanja i pukotine na plaštu obalnog zida), rampe i nožice zida, rasponske konstrukcije, opreme (poleri, mornarske stepenice, odbojnici, temeljna infrastruktura i mornarski ormarići) i sanacije zaštita nožice utvrdica i obalnih zidova.</p> <p>Nositelj projekta je Županijska lučka uprava Zadar, a sufinanciran je od strane Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Ukupna vrijednost radova iznosi 10.116.556,35 kuna s PDV-om.</p> <p>Sanacija je bila neophodna radi podizanja razine sigurnosti prilikom manevriranja brodovima, jer bi pri udaru vjetrova olujne jačine dovelo do obustave prometa na liniji.</p>

Izvođenje radova na sanaciji luke Silba Žalić

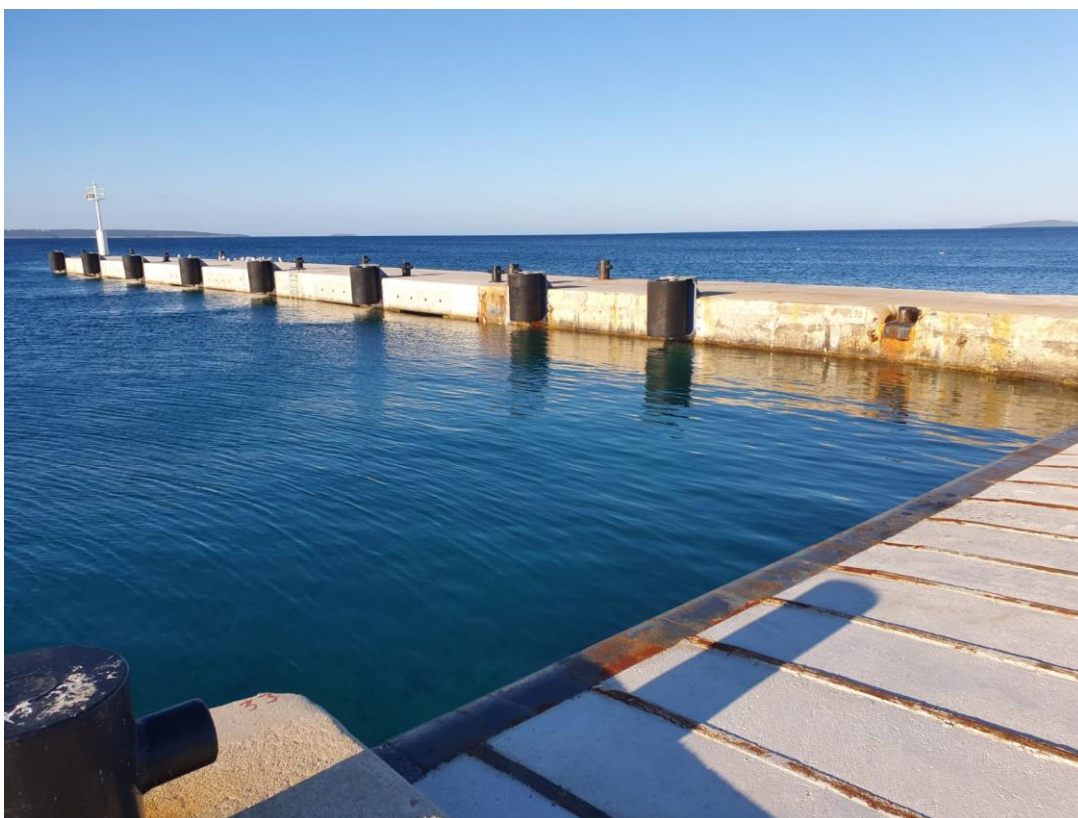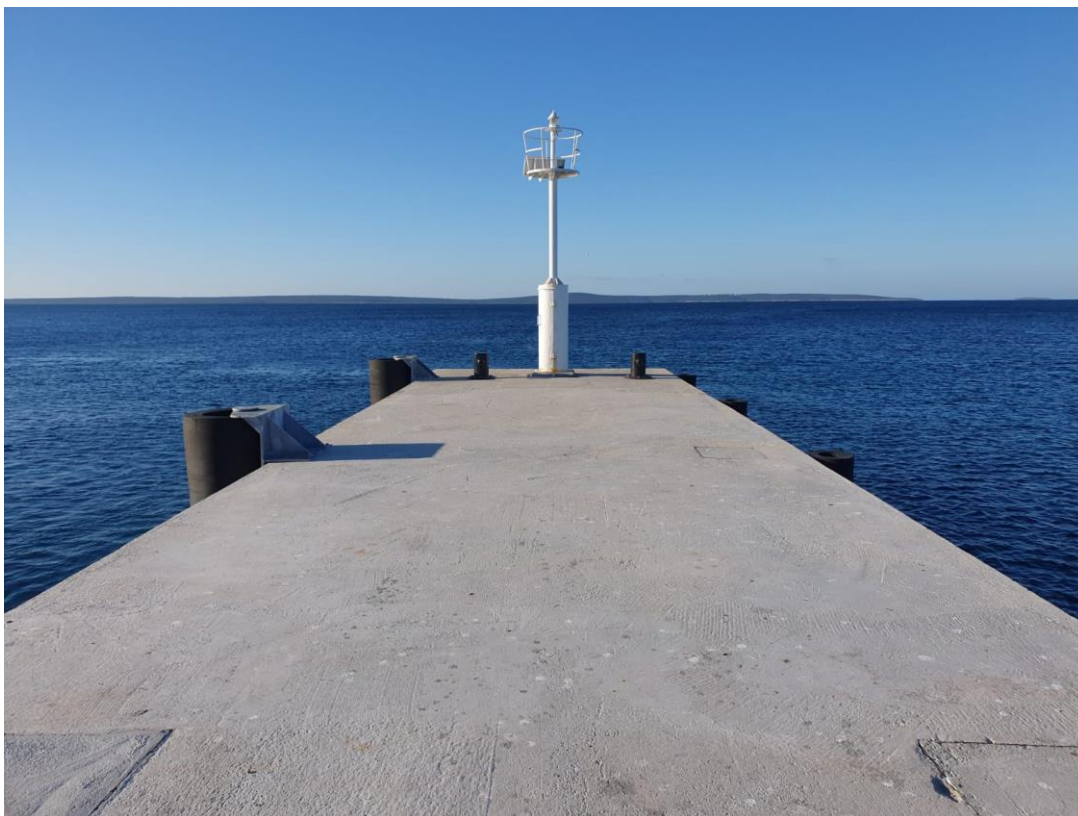

NAZIV PROJEKTA: Izvođenje građevinskih radova na sanaciji obale i lukobrana u luci Mrljane

IZVOĐAČ: PGP d.o.o. iz Zagreba

**IZNOS ULAGANJA U
2020. GODINI:** 2.508.983,26 kn





**KRATKI OPIS
PROJEKTA:**

Radovi sanacije obale i lukobrana izvedeni su po projektu izrađenom od tvrtke Kozina projekti d.o.o. iz Trilja, glavnog projektanta Boška Kozine, dipl. ing. građ. Zatečeno stanje obalnih zidova koji su dijelom bili izvedeni od betona, a dijelom od suhozida, zahtijevalo je temeljitu sanaciju na način da se izvede zamjenski obalni zid koji će imati zadovoljavajuću mehaničku otpornost i stabilnost. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provela je tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. iz Zagreba.

Dovršetkom projekta luka Mrljane dovedena je u stanje potpune sigurnosti i mehaničke stabilnosti za privez brodova i brodica te za odvijanje javnog putničkog prometa.

NAZIV PROJEKTA: Izvođenje građevinskih radova na sanaciji obale i lukobrana u luci Mrljane

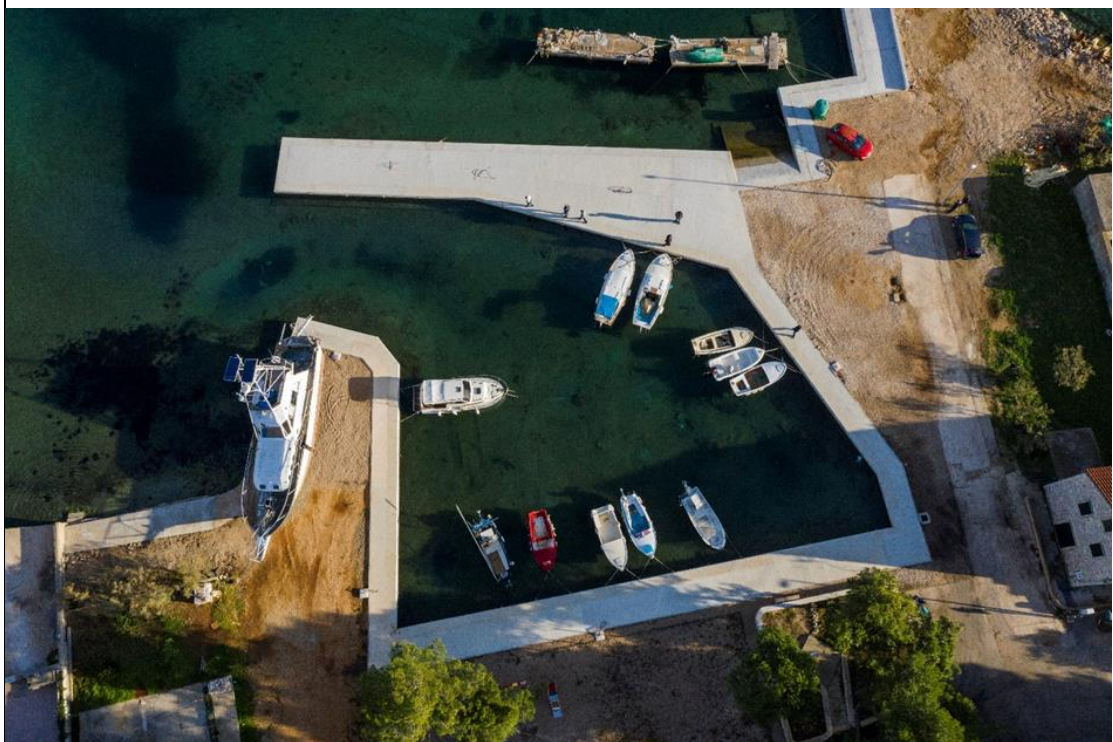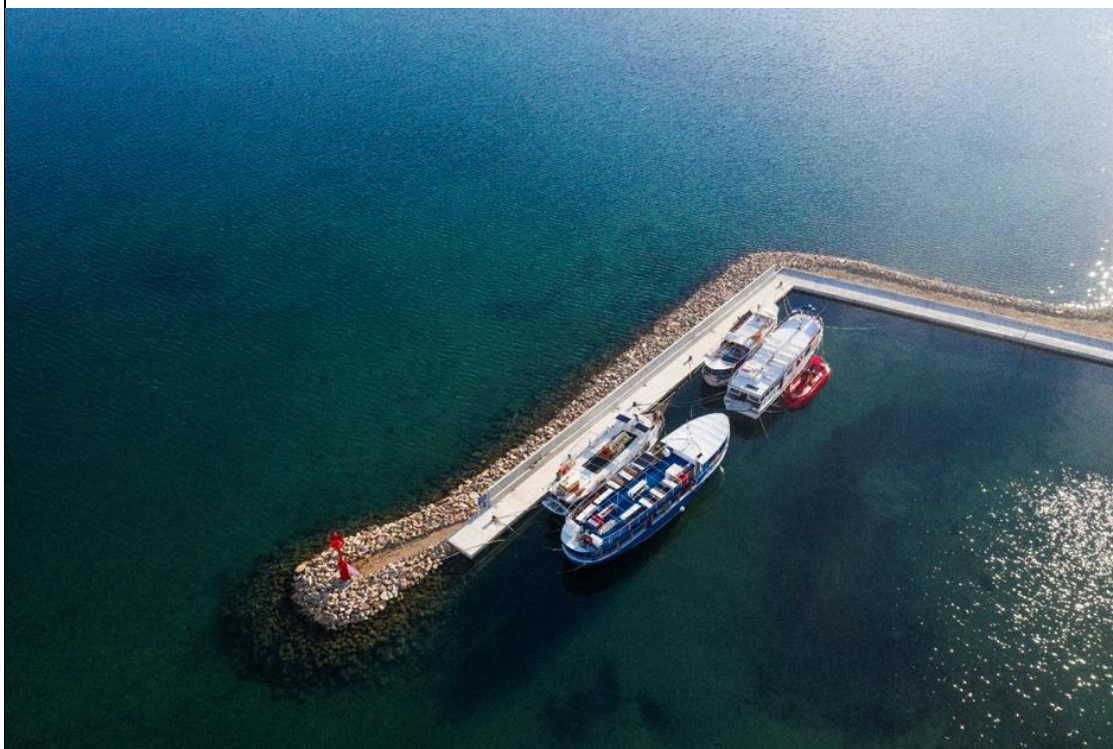

NAZIV PROJEKTA: Izvođenje radova na uređenju obalnog pojasa luke Drage Dugovača

IZVOĐAČ: P.G.P. d.o.o., Zagreb

IZNOS ULAGANJA: 7.841.882,70 kn



**KRATKI OPIS
PROJEKTA:**

Predmet obuhvata projekta je lučko područje za odvijanje javnog pomorskog prometa te dio luke koji obuhvaća komunalne vezove. Dio luke namijenjen za obavljanje linijskog pomorskog prometa (operativni dio luke) predviđen je na sjevernom dijelu uvale. Na spomenutoj poziciji planira se realizacija privezne obale u smjeru sjeverozapad – jugoistok, duljine cca 38,00 m, kao i privezni gat za obostrano pristajanje te vanjska pristanišna obala.

Na operativnom dijelu luke predviđen je prihvati plovila u javnom putničkom prometu, plovila opskrbe te većih izletničkih plovila. Na istočnom dijelu uvale, nastavno na dio luke za obavljanje javnog pomorskog prometa (operativni dio luke), planirana je realizacija obale za osiguranje komunalnih vezova (76 vezova). Radove će sufinancirati MMPI, Općina Pakoštane te ŽLU Zadar.

Ukupna vrijednost izgradnje luke iznosi 24,6 milijuna kuna s PDV-om, a procijenjeno vrijeme izvođenja radova je 15 mjeseci.

NAZIV PROJEKTA: Izvođenje radova na uređenju obalnog pojasa luke Drage Dugovača




<p>NAZIV PROJEKTA:</p> <p>IZVOĐAČ:</p> <p>IZNOS ULAGANJA U 2020. GODINI:</p>	<p>Izvođenje građevinskih radova na sanaciji lukobrana i mula u luci Vinjerac</p> <p>Akropolis d.o.o., Split</p> <p>3.600.598,75 kn</p> 
<p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p>	<p>U prvom studenom 2020. godine dovršeni su radovi na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac. Radovi su započeli u svibnju iste godine. Izvedeni su sukladno glavnom projektu sanacije izrađenom od ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Željka Čirjaka, dipl. ing. građ. koji je ujedno vršio i uslugu stručnog nadzora. Radovi na sanaciji lučice u Vinjercu izdvajaju se od sličnih radova s obzirom da se radi o kulturnom dobru te su izvedeni s posebnim oprezom sukladno konzervatorskim uvjetima.</p> <p>Gat, odnosno lukobran koji su bili predmetom sanacije su u funkciji prihvata i priveza brodica i brodova, istezališta te zaštite luke. Zatečeno stanje mula i lukobrana ukazivalo je na narušenu stabilnost i nosivost iz razloga što su s vremenom nastala razna oštećenja. Realizacijom sanacije lukobrana postigla se cjelovita funkcija zaštite lukobrana, a zajedno s parapetnim zidom i zaštita luke od valova.</p> <p>Cijeli zahvat sanacije osigurao je stabilnost i nosivost konstrukcije, a samim time i sigurnije korištenje vezova i prometa unutar luke. Projekt je financiran od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar.</p>

NAZIV PROJEKTA: Izvođenje građevinskih radova na sanaciji lukobrana i mula u luci Vinjerac



<p>NAZIV PROJEKTA:</p> <p>IZVOĐAČ:</p> <p>IZNOS ULAGANJA U 2020. GODINI:</p> <p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p>	<p>Izgradnja trajektne luke Tkon, faza I, podfaza II</p> <p><i>Kali gradnja d.o.o., Kali</i></p> <p><i>13.621.744,53 kn</i></p>  <p>Izgradnja trajektne luke Tkon kapitalni je projekt Županijske lučke uprave Zadar, čija je ukupna vrijednost veća od 45 milijuna kuna. Ovaj projekt ulaganja prvi je od 28 projekata koji se sufinancira bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u sklopu Programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet RH, koje je donijelo MMPI.</p> <p>U 2020. godini u potpunosti su dovršeni obalni i parapetni zid. Svi iskopi i nasipanja na dijelu propusta za cirkulaciju mora su završeni, postavljeni su predgotovljeni elementi "B" i "I" te se kreće s ugradnjom prednapetih nosača. Također su završena sva predviđena nasipanja oko ovih elemenata. Gotovi su radovi na izradi kamenih konstrukcija-pera, dva bliža obali dužine svaki 14 m koja služe za smanjivanje dužobalnog transporta pijeska.</p> <p>Propust za cirkulaciju mora je u potpunosti završen zajedno s prelaznim pločama, preostaje samo završni sloj asfalta. Izrađen je i spoj starog obalnog zida i propusta (podmorski i nadmorski dio).</p> <p>Završeno je postavljanju kamenih poklopnica na gatove i obalne zidove, iskop rovova za polaganje instalacija i pripreme za sanaciju obalnog zida.</p>
---	---

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja trajektne luke Tkon, faza I, podfaza II

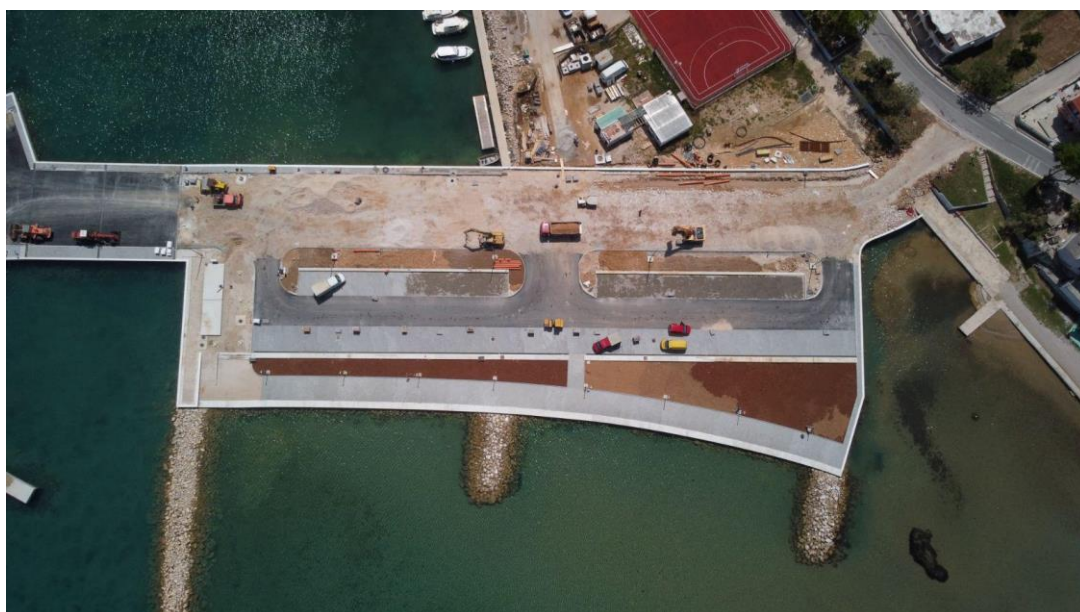

NAZIV PROJEKTA: Izvođenje građevinskih radova na sanaciji obale i lukobrana u luci Pakoštane

IZVOĐAČ: Stipčević d.o.o., Zadar

**OSTVARENI IZNOS
ULAGANJA:** 773.745,82 kn





**KRATKI OPIS
PROJEKTA:**

U luci otvorenoj za javni promet u Pakoštanima, u lipnju 2020. godine, izvedeni su radovi sanacije stare rive i gata. Sanacija je obuhvatila betonske podmorske radove, sanaciju školjere, kameno opločavanje gata, betoniranje nove ploče i zamjenu kamenih poklopaca. Na cijelom području zahvata su postavljeni novi profili za privez (aneli). Školjera koja je sad u punoj funkciji zaštite lukobrana zajedno s parapetnim zidom pruža potpunu zaštitu luci od valova.

Sanacija je bila nužna zbog toga što su stabilnost i nosivost umanjeni, a dijelom i narušeni iz razloga što su se s vremenom realizirala razna oštećenja te je postojala mogućnost urušavanja. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.800.000,00 kn s PDV-om.

NAZIV PROJEKTA: Izvođenje građevinskih radova na sanaciji obale i lukobrana u luci Pakoštane

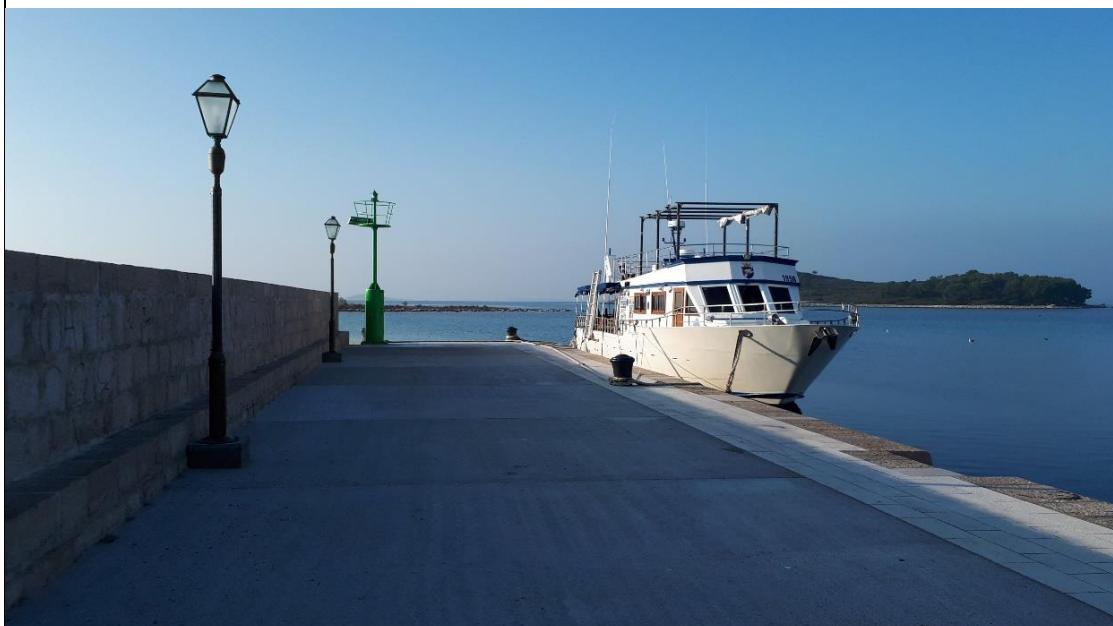

NAZIV PROJEKTA:	Sanacija lukobrana i školjere u luci Božava
IZVOĐAČ:	<i>Sub Mission j.d.o.o., Zadar</i>
IZNOS ULAGANJA U 2020. GODINI:	375.625,00 kn
	
KRATKI OPIS PROJEKTA:	<p>U lipnju 2020. završeni su građevinski radovi "Dohrane školjere u luci Božava". Naručitelj projekta jest Županijska lučka uprava Zadar koja je u potpunosti i financirala isti. Građevinske radove je izvršio SUB MISSION j.d.o.o. dok je uslugu stručnog nadzora izvršio Filip Juranov, ovlaštenu inženjera građevinarstva.</p>

NAZIV PROJEKTA: Sanacija oštećenja rive u luci Petrčane


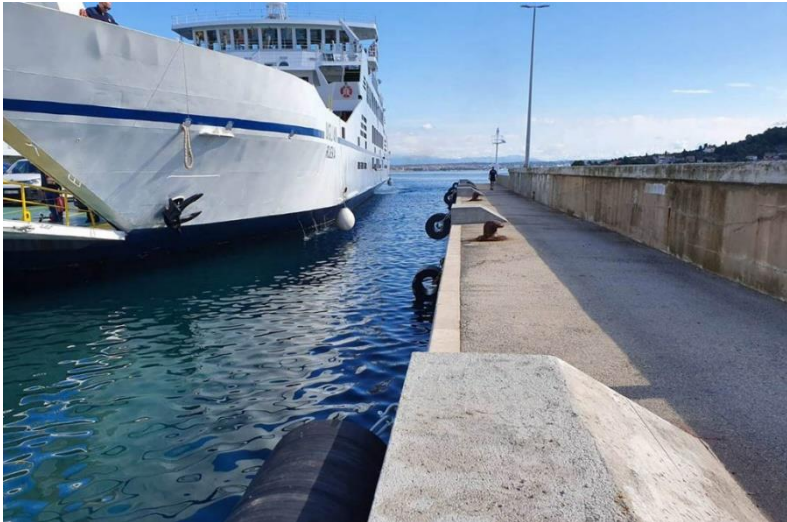
IZVOĐAČ: Stipčević d.o.o., Zadar

**IZNOS ULAGANJA U
2020. GODINI:** 440.539,54 kn



**KRATKI OPIS
PROJEKTA:**

Županijska lučka uprava Zadar dovršila je sanaciju obalnog zida na dijelu rive, koji je urušen tijekom nevremena u luci lokalnog značaja Petrčane. Sanacija je započela u studenom 2020. godine te je ista završena prije ugovorenog roka od 45 dana. Ovim obuhvatom zatvoren je spoj jednog dijela stare rive s novouređenim dijelom na kojem je planiran nastavak treće faze rekonstrukcije luke Petrčane.

<p>NAZIV PROJEKTA:</p> <p>IZVOĐAČ:</p> <p>IZNOS ULAGANJA:</p>	<p>Uređenje šetnice u luci Nin od Donjeg mosta do Gospinog mula</p> <p><i>Cemex Hrvatska d.o.o., Kaštel Sućurac</i></p> <p><i>342.694,38 kn</i></p> 
<p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p>	<p>Županijska lučka uprava Zadar započela je u ožujku 2020. godine s radovima na uređenju šetnice u luci Nin od Donjeg mosta do Gospina mula, ukupne dužine 220 m. Uređenje je obuhvatilo postavljanje nove podloge dekorativnog betona i sanacija dijela obalnog zida na mjestima gdje je to bilo neophodno. Radovi su završeni u svibnju 2020. godine.</p>
<p>NAZIV PROJEKTA:</p> <p>IZVOĐAČ:</p> <p>IZNOS ULAGANJA:</p>	<p>Putnička luka Preko – AB utvrdice</p> <p>P.G.P d.o.o., Zagreb i ŠEVENDA TARMAN CHEMIE d.o.o., Čehovec</p> <p><i>320.729,25 kn</i></p> 
<p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p>	<p>Izrada pet armirano betonskih utvrdica prethodila je postavljanju novih bokobrani koji su se na njih postavili. Naime, zbog povećanja sigurnosti prilikom pristajanja trajekta „Ugljan“ koji je dug 102,20 metara, širok 18, a visok 3,9 metara, bilo je potrebno ugraditi nove bokobrane na veću visinu od dosadašnje.</p>

**SIGURNOST
PROMETA U LUCI:**

OSTALI PROJEKTI ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

UKLONJENA PODRTINA JAHTE SER IZ LUKE MRLJANE

Temeljem rješenja Lučke kapetanije Zadar, Ispostave Biograd na moru, Županijska lučka uprava Zadar uklonila podrtinu potonule jahte imena SER iz luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Mrljane. Vlasnik 23-metarske jahte SER je tvrtka Brodski prijevoz d.o.o. u stečaju.

Podrtinu je bilo potrebno ukloniti zbog opasnosti da se druga plovila oštete prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz predmetne luke, a ujedno je i postojala mogućnost da pojedini dijelovi opreme broda ne isplivaju i ugroze sigurnost drugih plovila koja plove tim područjem



**SIGURNOST
PROMETA U LUCI:**



**IZVUČENE TRI POTOPLJENE
BRODICE U LUCI KUKLJICA -
OTOK UGLJAN**

U luci Kukljica na otoku Ugljanu 27. veljače 2020. godine izvedena je akcija čišćenja luke tj. izvlačenje olupina triju plovila koja su otežavala korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navedenih radova je Županijska lučka uprava Zadar.



**SIGURNOST
PROMETA U LUCI:**

IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI KALI-BATALAŽA, OTOK UGLJAN

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Kali- Batalaža na otoku Ugljanu izvedena je akcija izvlačenja olupine broda koji se nalazi u uvali predmetne luke te je time otežavao korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnost prometa u luci. Naručitelj navedenih radova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo ZOE Projekt d.o.o. Olupina se nalazila na kompliciranom mjestu, na pola dužine mola na kojeg ne mogu pristupiti vozila ni dizalica. Težina broda je bila 56 tona te je izvlačenje istog iz muljevitog dna bio priličan izazov. Cijeli proces je tekao kroz faze, prvo je brod olakšan rezanjem dijelova nadgrađa, zatim je olakšan padobranima (baloni punjeni zrakom) i dotegljen uz obalu, kako bi mu mogla prići dizalica. Nakon toga izvađeni su dijelovi poput ostataka kabine, vitla, poklopca motora, hidraulike slično. Tek tada je bilo moguće početi dizati. Na kraju se ispostavilo da je težina izvađenog materijala bila 60 tona. Materijal je razvrstan na drvo i metale te zbrinut preko tvrtke CIOS, te će biti recikliran. Radovi su u potpunosti financirani od naručitelja radova, a ovim projektom se plovno područje unutar luke može nastaviti odvijati sigurno za sve korisnike.



**SIGURNOST
PROMETA U LUCI:**

Postavljeno lučko svjetlo u luci Sv. Filip i Jakov (2020.)



U srpnju 2020. godine, na zapadnom uglu pristana u luci Sv. Filip i Jakov, postavljeno je novo lučko svjetlo. Radovi su izvedeni od strane tvrtke Plovput d.o.o., a cijena istih iznosi 75.000,00 kn s PDV-om.

Postavljena zaštitna ograda na šetnici u lučici Mandre

Županijska lučka uprava Zadar, na inicijativu Općine Kolan, postavila je početkom studenog 2020. godine zaštitnu metalnu ogradu u lučici Mandre, Općina Kolan.

Metalna ograda dužine 80 m s pocinčanim vertikalnim prečkama doprinijet će većoj sigurnosti šetača i biciklista.

Radove je izvela tvrtka Metalobrada Perković, a sufinancirani su od strane Općine Kolan.




**POVEĆANJE
KAPACITETA LUKE:**

Postavljen plutajući gat – luka Telašćica

U luci otvorenoj za javni promet Telašćica postavljen je plutajući gat dužine 20 m. Navedenim projektom se povećao kapacitet luke. Ukupna vrijednost radova iznosi 456.415.00 kn bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuditelj za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je Jadranski ronilački servis d.o.o. te su isti izvedeni u predviđenom roku. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja na kontinuiranom ulaganju i nadogradnji luka povećavanjem kapaciteta te sigurnosti korištenja luka pod upravom Županijske lučke uprave Zadar.



<p>ODRŽAVANJE LUKA:</p>	<p>Postavljanje sidrenog sustava i muringa u lukama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Luka Muline</i> • <i>Luka Jazine</i> • <i>Luka Pag</i> • <i>Luka Kukljica</i> • <i>Luka Olib</i> • <i>Luka Sali</i> • <i>Luka Božava</i> <p>Ukupna investicija u održavanje sidrenog sustava u lukama županijskog i lokalnog značaja za 2020. godinu iznosi: 161.319,88 kn, dok je za postavljanje inox anela i bitvi u lukama uloženo 33.300,00 kn.</p> <p>Postavljanje bokobrana</p> <p>U lukama Božava i Veli Iž postavljeni su bokobrani u vrijednosti od 18.750,00kn.</p> <p>Reklamni panoi i table</p> <p>U lukama Pakoštane, Vinjerac, Mrljane postavljene su table u vrijednosti od 23.552,50 kn., a u lukama Pag, Preko i Nin postavljena je tabla s reklamnim panoom u vrijednosti od 52.037,50 kn.</p> <p>Postavljanje plutača</p> <p>Za vrijeme građevinskih radova u luci Pakoštane -uvala Dugovača postavljene su plutače u vrijednosti od 23.750,00 kn, dok su u luci Vinjerac postavljene svjetleće plutače Seal Tech od 4.037,50 kn.</p> <p>KLASA: 400-02/19-01/01 URBROJ: 2198-1-87/1-21-13 U ZADRU, 11. svibnja 2021. godine</p> <p style="text-align: right;">ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR</p> <p style="text-align: right;">Ravnatelj</p> <p style="text-align: right;">Davor Škibola, dipl. ing.</p> 
--------------------------------	--
